


27.11.2020 Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 13
Das Ende der ersten Bauphase in 2020

Heute haben Andreas, Dennis und Luca die Baustelle der Parkour-Anlage in einem top Zustand verlassen. Alles war sehr sauber, der Bauzaun wie gewünscht vor dem gefegten Weg aufgestellt, die Laufbahn abgezogen und sogar der gesamte Parkplatz gereinigt. Auch die Geräte und Maschinen wurden noch alle abgeholt, nachdem:

1. der Bereich vor und hinter der neuen Grillhütte gepflastert, die Randsteine für den Grünstreifen verlegt und Schotter aufgefüllt und gewalzt/gerüttelt wurde,



2. die Oberflächenstruktur des Betons an einigen Stellen, z.b. am später sichtbaren Innenbereich der „Höhle“, der Optik wegen bearbeitet wurden,

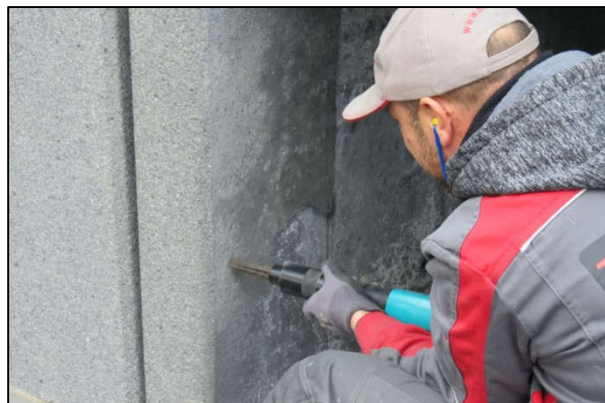

3. die Gewindelöcher, an denen die Elemente transportiert wurden, mit einer Spachtelmasse aus Akemi Steinkitt 1000 transparent L-Spezial, ein paar Tropfen Schnellhärter sowie Steingranulat verschlossen wurden und



4. noch etwas zum Essen serviert wurde -> diesmal keine warme Fleischwurst mit Brötchen, sondern Currywurst mit Pommes ☺

An dieser Stelle mein und unser aller Dank an Andreas, Dennis und Luca für die weltklasse Arbeit in den vergangenen sieben Wochen. Es war sehr schön und interessant die Bauarbeiten kontinuierlich zu verfolgen und Euren sehr gut verständlichen und oftmals geduldigen Erklärungen zuzuhören.



● Aus Datenschutzgründen gemäß DSGVO bilden wir Gesichter von Personen, die keine Mitglieder der TSG sind, nicht ab, wenn sie deutlich erkennbar sind.

Abends wurde zuerst noch der Bauschutt-Container abgeholt und anschließend kam dann für dieses Jahr letztmalig der große Sattelzug, der den Container und die Maschinen auflud und zurück nach Elz brachte, bevor es dann im Frühjahr 2020 mit dem Aufstellen der Stangen und den Bodenarbeiten weitergeht.



Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Christoph Kratzer
1. Vorsitzender
