

18./19.05.2021

Parkour-Anlage – Baufortschrittsbericht Nr. 28 Abnahme durch den TÜV und die Stadt Frankfurt


Gestern fand die TÜV-Abnahme der Parkour-Anlage statt. Zusammen mit unserem zuständigen Bau-Ingenieur, Herrn Rico Erler, begrüßte ich die Herren Wildner und Staudt vom TÜV Hessen auf der neuen Parkour-Anlage. Gute 1,5 Stunden dauerte das genaue Inspizieren und Prüfen der Anlage.



*Zukunft
Gewissheit geben.*



Der Boden, die Betonblöcke, die Stangen, alle Fugen sowie die Oberflächen wurden in Augenschein genommen und kritisch untersucht. So sollte es auch sein, denn die Sicherheit der Anlage ist schließlich in unserem eigenen Interesse und aus Haftungsgründen auch wichtig.

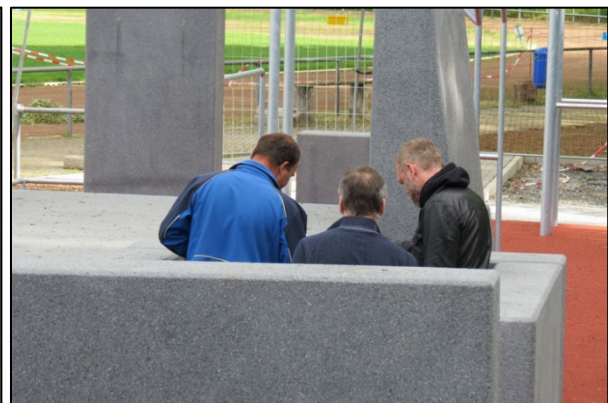

Mir als Laie wären bestimmte Dinge gar nicht aufgefallen und so war ich froh, als die ordnungsgemäße Bauausführung bestätigt wurde und die Anlage grundsätzlich freigegeben werden kann, sobald die folgenden Mängel beseitigt sind:

1. das Anbringen von Hinweisschildern,
2. das Verschließen einer kleinen Fußfangstelle,
3. das Beischießen einer herausgebrochenen Ecke und
4. das Entfernen kleiner Stahlteile in einem Betonelement.

Bereits am nächsten Tag lag der Bericht von Herrn Staudt vor ([siehe nächste Seite](#)), der die Mängel mit Bildern und detaillierten Erläuterungen beinhaltete. Diese sollten im Laufe der nächsten Tage m.E. schnell und problemlos behoben werden können.



*Zukunft
Gewissheit geben.*

Prüfbericht

Abnahmeprüfung gemäß DIN EN 16899

Auftraggeber: Stadt Frankfurt am Main
Frau Sveja Gondolf
Grünflächenamt 67.12 Planung und Bau
Adam-Riese-Straße 25
60327 Frankfurt am Main

Objekt / Anlage: **TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.**
Parkouranlage am Sportplatz Nieder Erlenbach

Betreiber: TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.

Datum der Prüfung: 19.05.2021

Prüfer: Dipl.-Ing. H. Wildner TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH

Teilnehmer: Herr Erler (Architekt)
Herr Kratzer (Präsident)
Herr Staudt (TÜV Hessen)

Prüfergebnis:¹ Die Parkouranlage entspricht den sicherheitstechnischen Anforderungen und kann nach Beseitigung der Mängel zur Benutzung freigegeben werden.

Frankfurt, 19.05.2021

Ort, Datum

Dipl.-Ing. Holger Wildner

Hinweise:

- 1 Die auszugsweise Wiedergabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbezwecken bedürfen der schriftlichen Genehmigung der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH.
- 2 Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände.



Handelsregister Darmstadt HRB 4915
Id.-Nr.: DE 111665790
Informationen gem. §2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-hessen.de/impressum

Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Matthias J. Rapp
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Henning Stricker
Dipl.-Kfm. Thomas Walkenhorst

Telefon: +49 69 7916-272
Telefax: +49 69 7916-235
www.tuev-hessen.de

TUV®

Beteiligungsgesellschaft
von:



TÜV Technische
Überwachung Hessen GmbH
Life Service
Sicherheit-Gesundheit-Qualität
Am Römerhof 15
60486 Frankfurt am Main
Deutschland

Managementsystem
ISO 9001 / ISO14001
zertifiziert

Heute fand dann gleich die Abnahme der Anlage durch das Grünflächenamt, vertreten durch Herrn Feilhaber, und dem Sportamt, vertreten durch Herrn Breideband, statt.



Sie ließen sich die festgestellten Mängel seitens des TÜVs von Herrn Erler genau erklären. Weitere Kleinigkeiten, wie die Kabelverlegung in der Höhle und leicht nachzubessernde Silikonfugen wurden in einem separaten Protokoll festgehalten und ebenfalls von den Beteiligten unterzeichnet.



Der Plan ist, dass die Firma Heus in der kommenden Woche, d.h. direkt nach Pfingsten, die aufgeführten Mängel beseitigt, anschließend den Bauzaun abmontiert, den Bereich um die Anlage mit Mutterboden glättet und dann Rasen einsät. Danach terminieren wir dann die erste Trainingseinheit und werden besprechen, wann die Anlage offiziell eröffnet/eingeweiht werden soll.

Bis zum voraussichtlich letzten Bericht nächste Woche bleibt alle gesund & munter.

Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Euer Christoph
