


Bericht Nr. 10 – Pflasterarbeiten – 29.06.2019



Heute Morgen starten Danilo und ich schon ganz früh, da auch am Boulderblock noch die Terrasse auf uns wartete. Der am Vortag gelieferte Kies wurde verteilt und Danilo begann die Fläche professionell auszurichten.



Nachdem die erste Steinreihe sauber und gerade gesetzt war, arbeiteten wir Hand in Hand weiter. Danilo zog die Fläche Stück für Stück ab und ich holte hinter unserem Geräteschuppen die alten Steine und setzte einen Stein nach dem anderen an.

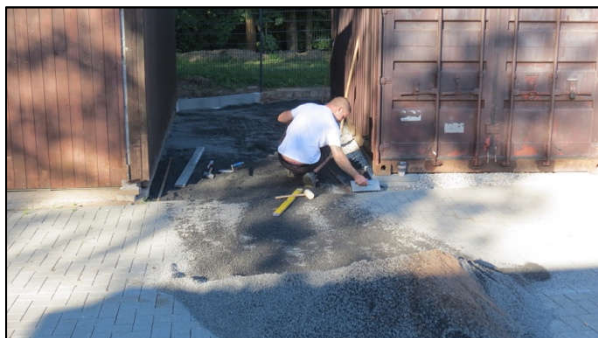

Später fehlte uns dann etwa noch ein halber Kubikmeter Kies, den uns Torsten dann mit Wagen und Anhänger noch schnell beim Maeusel holte und half abzuladen.

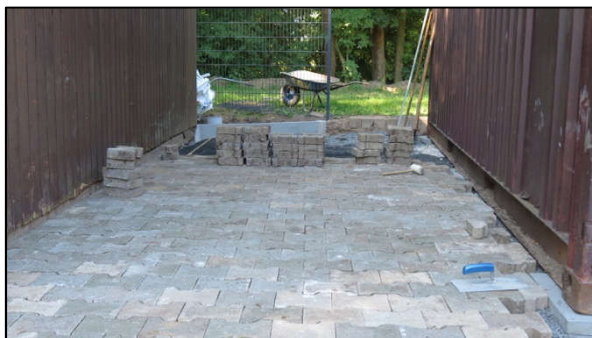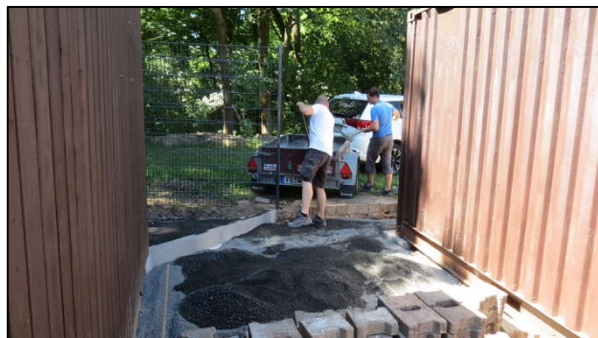

Damit sind wir wieder ein gutes Stück vorangekommen. Urlaubsbedingt versuchen wir nun vor Beginn des neuen Schuljahres fertig zu werden.

Beste Grüße
Euer Christoph
