



17.05.2019 – Bericht Nr. 2 – Umstellen des Containers

Nach langen Überlegungen, sehr vielen Gesprächen sowie immer wieder neuen Ideen und Vorschlägen wurde für heute einfach ein Teleskopklader bei der Lade- und Transportgemeinschaft Wetterau West bestellt, mit dem der Container zwischen der Leichtathletikhütte und dem Geräteschuppen umgestellt werden sollte.

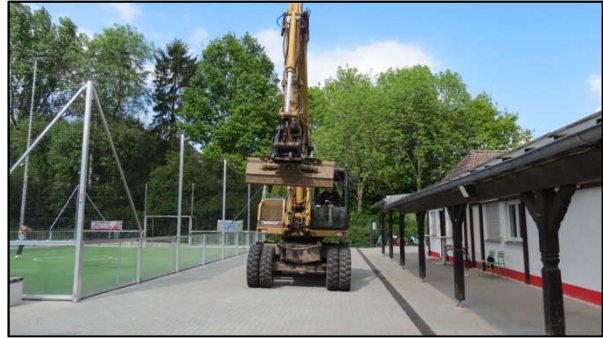


Pünktlich um 16.00 Uhr stand dann der Teleskopklader vor dem Einfahrtstor unserer Sportanlage und wurde ruckzuck zum Container manövriert.

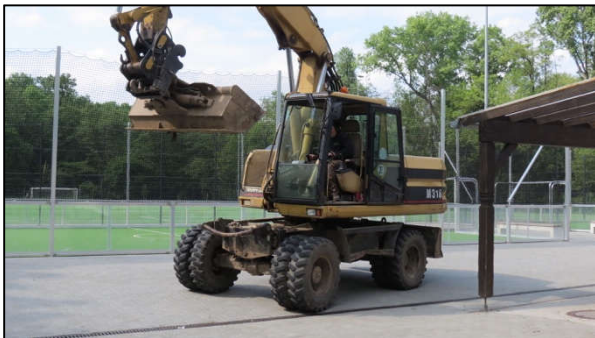

Ketten dran, einhaken, hochziehen und Pech gehabt. Die ersten Versuche schlugen fehl, weil die Schaufel im Weg und die Ketten anscheinend zu lang waren.



Kurzerhand wurde die Schaufel abmontiert, an der Seite gelagert und der Teleskopklader anders platziert. Des Weiteren wurde die Ketten verkürzt, bzw. anders eingehakt und nach mehrmaligem adjustieren ging es weiter mit dem 2. Versuch.

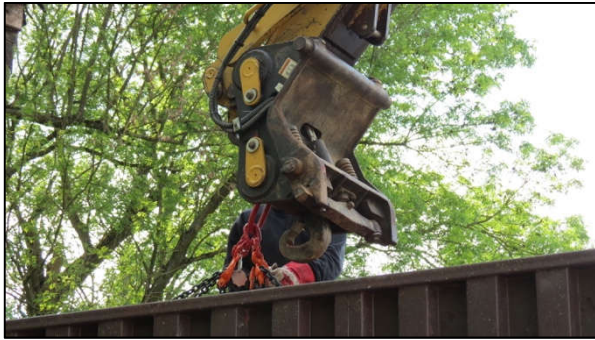

Dieser war von Erfolg gekrönt, auch wenn die Dächer von der LH und dem GS leicht touchiert und etwas in Mitleidenschaft gezogen wurden und der Teleskoplader durch das hohe Gewicht doch etwas die Pflastersteine eindrückte. Diese leichten Schäden müssen wir halt später wieder in Ordnung bringen. Das kriegen wir schon hin!



Nach Begutachtung des Untergrunds durch unsere Bauingenieurin Gabi Gärtner und unseren 2. Vorsitzenden Albert Warkentin wurde die weitere Vorgehensweise, bzw. die nächsten Arbeitsschritte besprochen. Wir montierten den Zaun ab und zu zweit ging es los mit dem Abtragen und Stapeln der Steine hinter dem Geräteschuppen.



Zu späterer Stunde waren rd. 600 Pflastersteine aufgesetzt und die Fläche frei von Steinen, so dass am nächsten Morgen gleich mit dem Aushub begonnen werden kann.

In diesem Sinne auf ein gutes Gelingen des Projekts
Euer Christoph Kratzer
1. Vorsitzender
